

# 项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

## 一、任命

现任命 李运 同志，担任 自贡兴建材有限公司专用柴油储存设施 项目组长。  
安全现状评价

## 二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年 3月 23日



# 一 现场基本情况记录表

## 1 企业概况

项目名称: 直良安才建材有限公司车用柴油储存设施 现状评价

项目类型: 现状评价 企业性质: 有限责任公司

投资金额: 伍仟万元 法定代表人: 叶康川

地理位置: 直良县北古坛镇北羊村 小组。

筹建或建成投产时间 柴油储存设施待投用

生产经营类型: 内部柴油储存, 不对外经营

生产能力或设计规模: 50m³ 柴油 21

生产经营的主要产品及物料: 0#柴油

证照或核准情况: 有营业执照

每年最大生产时间 365 天, 每天工作 1 班(8小时)。

人员编制: 管理人员 1 人、生产人员 1 人。

专职安全员 1 人, 兼职安全员 0 人。

## 2 地理位置及交通


项目所在地距 直良县 城市约 18 公里, 位于 (要求细化到小地名或社区) 直良县北古坛镇北羊村北羊街村。

地理坐标: \_\_\_\_\_

交通: \_\_\_\_\_



### 交通位置示意图

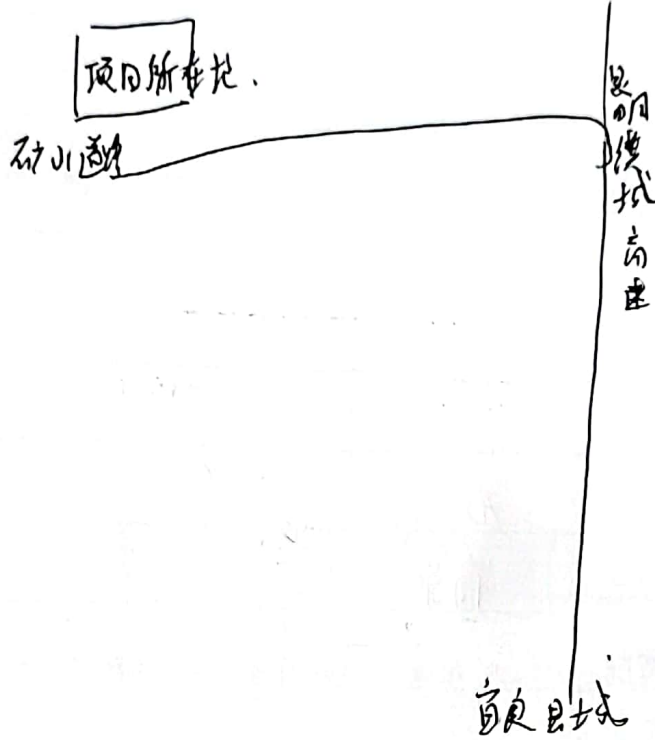

注：为便于分析周边区域的情况、项目周边交通关系，手工绘出较小范围内的交通位置示意图，同时要求标出相对距离。

### 3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是□、否~~□~~） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否~~□~~）。

据现场踏勘，<sup>项目</sup>用地地势平坦，北面为高坡。

气象条件：是否提供了相关资料？（是□、否~~□~~） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否~~□~~）。

经查询，当地年平均气温 $16.3^{\circ}\text{C}$ ，年平均日照 $2177.3\text{h}$ 。

全年无霜期 $260\text{d}$ 左右。



3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。

(1) 地层

(2) 构造

(3) 地质特征

3.2 水文地质条件 是否提供了相关资料? (是、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。

(1) 孔隙水赋存:

(2) 岩溶水赋存:

(3) 地表水体:

无

(4) 水文条件类型:

简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。

(1) 工程地质岩组:

(2) 边坡稳定性分析:

稳定 需注意北面边坡

(3) 工程地质条件类型:

简单

3.4 环境地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况:

无

(2) 不良地质作用:

无

(3) 对环境污染情况:

无

(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况:

无




(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况：无


(6) 环境地质条件类型：简单

#### 4 周边环境：

北面为山坡。南面为道路 东面1.5km处为办公区。

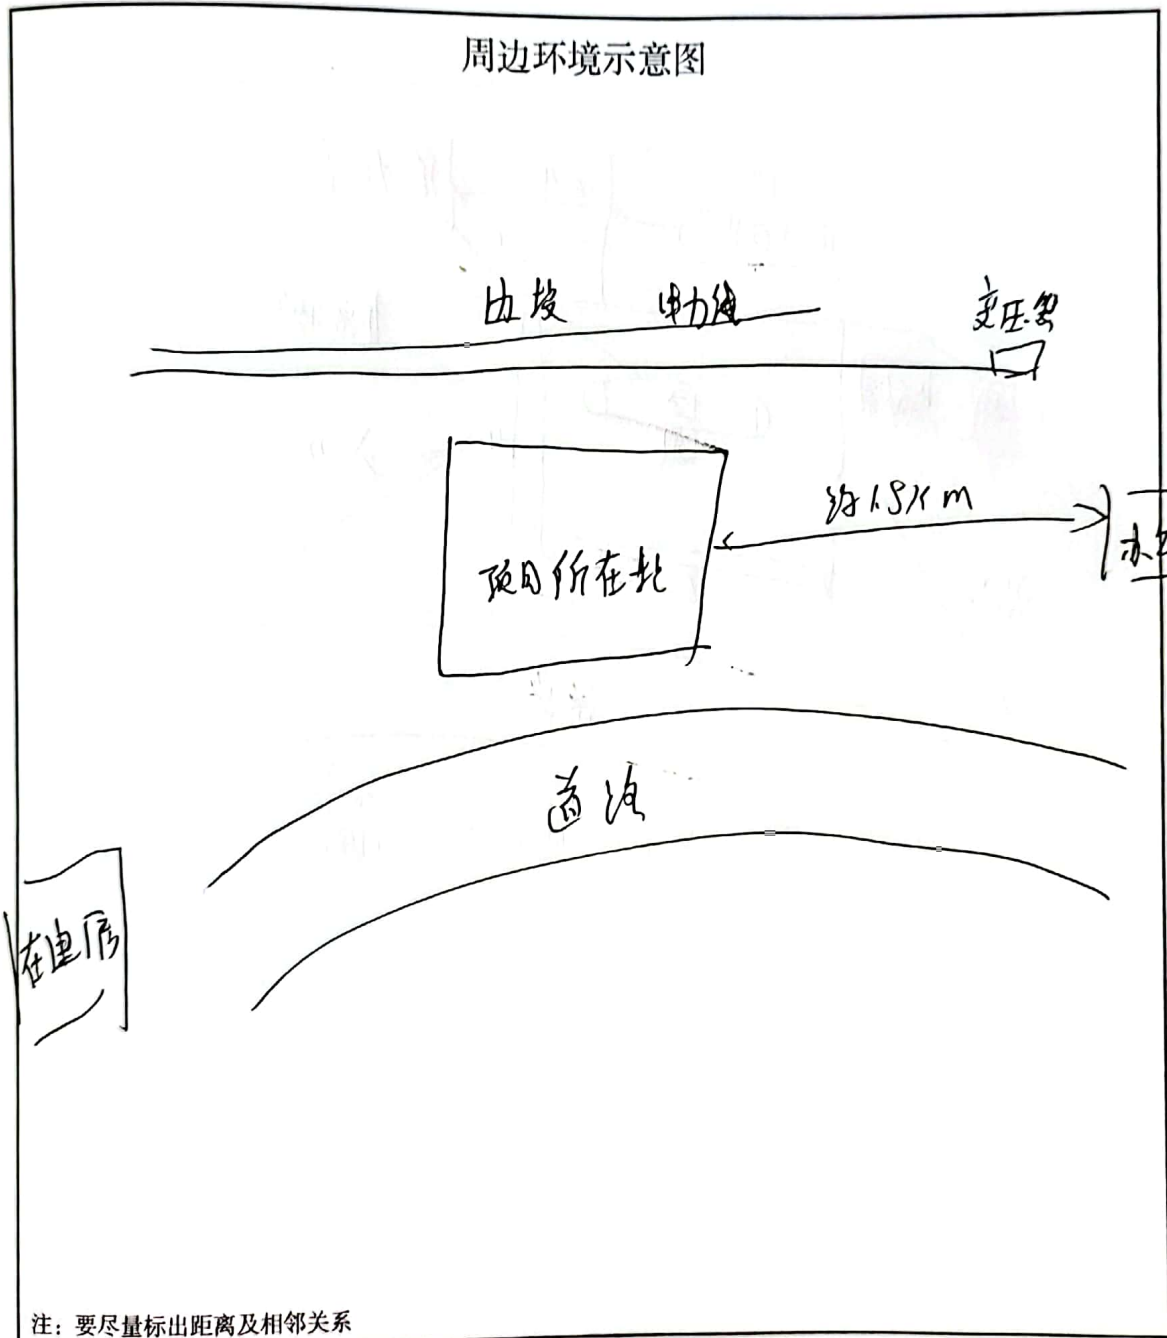

5. 生产区域平面布置情况: \_\_\_\_\_

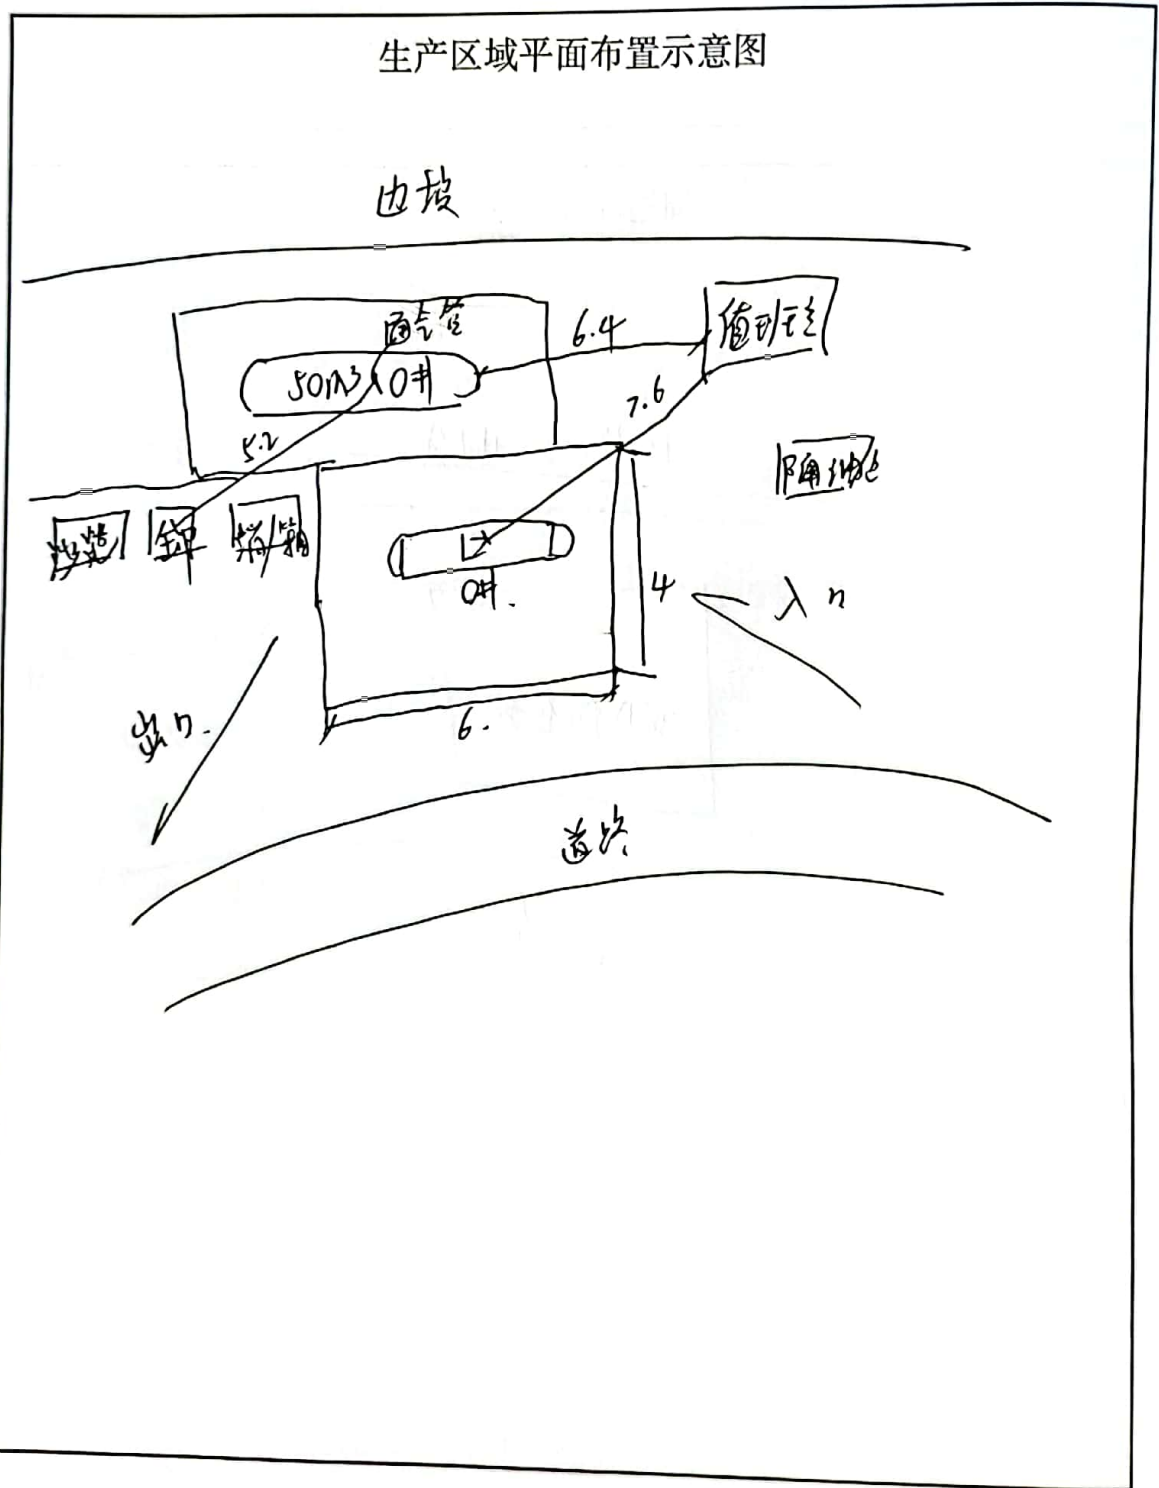

6. 仓储区域平面布置情况: \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

仓储区域平面布置草图

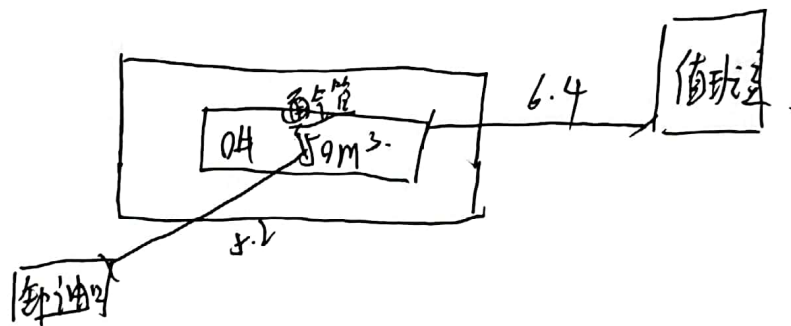





11. 供电

项目用电为三级负荷，引自矿山供给，配电室设置在值班室，变压器设置情况无。变压后，电压为380 / 220 V供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况（或排土场）情况

设有隔油池

13. 供排水情况：是否提供了相关资料？（是□、否□） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否□）。

由矿山供给



14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

安全员2名(侯托矿山)

(2) 从业人员安全教育及持证情况

已持证上岗

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间	安全培训机构	证号 有效期
1	叶鹿川	主要负责人		530127198208142717		2023.9.10
2	叶小峰	安全员		510127197908762158		2023.9.10
3	左锐清	安全员		530127198103122717		2023.9.10
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等):

有管理制度、基本齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况: 未见记录

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况: 矿山已提出要求发放

(6) 安全警示标志设置情况: 卸油口、加油区、值班室均已设置  
标志, 但部分不全

(7) 事故应急救援预案情况: 现场检查时, 柴油储存设施  
无应急预案

(8) 记录、档案、台帐建设情况: 未提供 (未投入使用)

(9) 保险情况: 已购买





# 昭通市鼎安科技有限公司

## 安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 宜良兴安建材有限公司 柴油 项目类型: 危险现状评价  
法定代表人(负责人) 叶建川 联系电话: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

### 现场发现的问题及建议:

1. 油罐液位仪、泄漏检测设备未完成安装;
2. 电气接地、电气线路未完成安装;
3. 静电接地报警器未连接接地线桩;
4. 油水分离池设置不规范,未设水封管,水封高度不足;
5. 消防沙箱设置不规范,基础未作防水处理,基础高度不够,建议高度不低于0.2m;
6. 未配备消防沙、消防桶、消防铲、灭火器、灭火毯;
7. 未设值班室,值班室可与配电室合建,油罐液位仪、泄漏检测报警器安装在值班室内;
8. 油罐操作井内接线盒、法兰螺栓未安装完成;
9. 未设加油量油操作规程,禁止烟火标识。

委托方负责人: 叶建川 现场检查人员: 陈朝春 李廷大

昭通市鼎安科技有限公司

2022年4月11日

注:本建议书一式三份,请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认,本检查建议书将报送安全生产监督管理局。

